



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur


8. august 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-34-25

Medarbejder: siglun1

Projektforslag: hævnning af vandløbsbund, etablering af afværgeforanstaltning og udjævning af gammel plovfure på matrikel 30a Ørum Klitter, Ørum

Projektets formål er at genskabe naturlig hydrologi i projektarealet, uden at påvirke private arealer som ikke indgår i projektet. Dette gøres ved at hæve vandløbsbunden i afvandingsgrøfter til terræn, udjævne en tydelig plovfure og etablere en lavning som afværgeforanstaltning. Alle tiltagene placeres på matrikel 30a, Ørum Klitter, Ørum, og påvirker ligeledes matrikel 9, Ørum Klitter, Ørum.

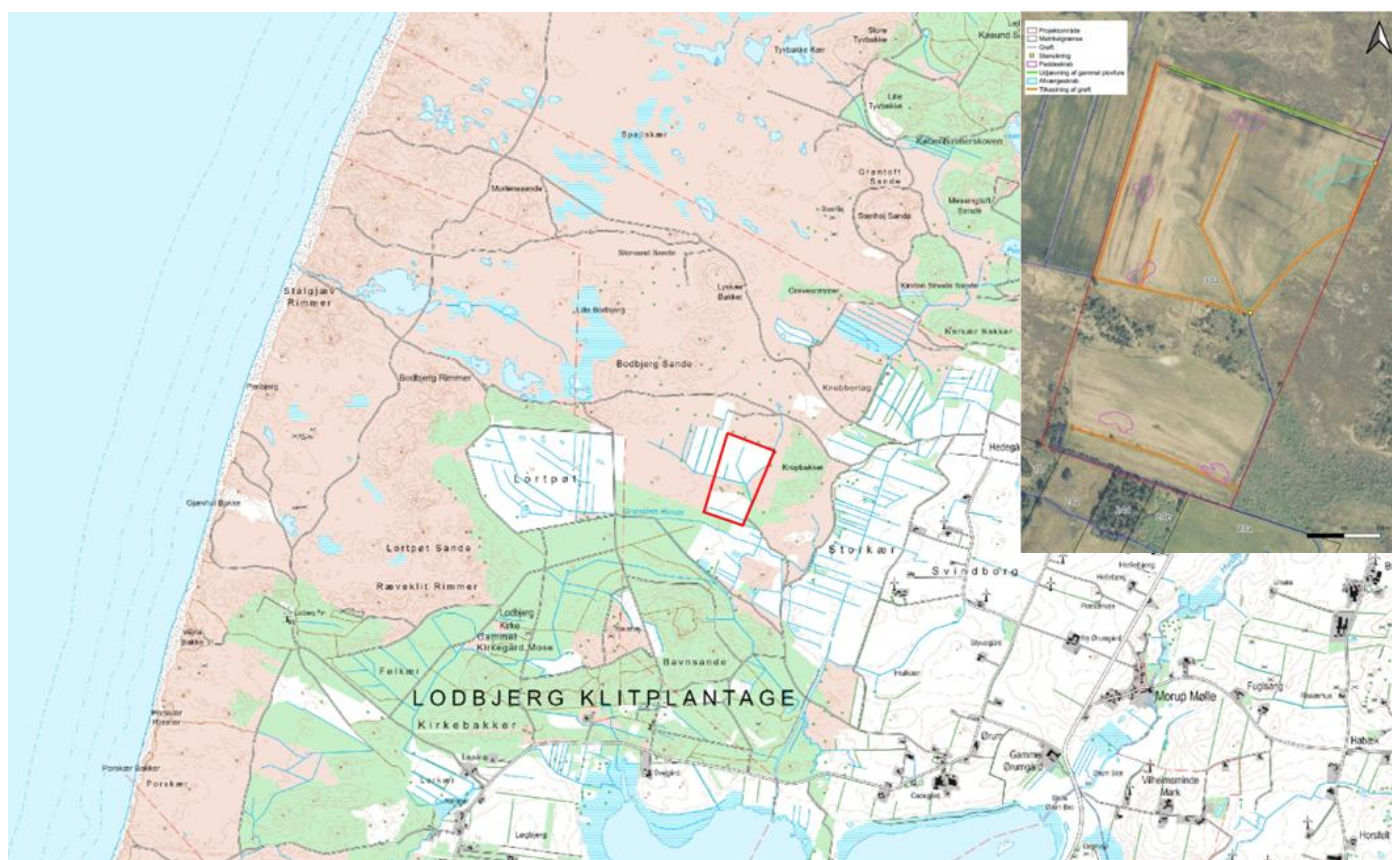

Oversigtskort med placeringen af projektet. Placeringen er markeret med rød firkant.

Beskrivelse af eksisterende forhold og planlagte tiltag

Projektområdet er beliggende i habitatområde nr. 184 og indeholder både naturtyper og vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projektområdet indeholder derudover tidligere opdyrkede og afgræssede arealer, som har været afvandet længe. Nationalpark Thy ønsker derfor at genskabe den naturlige hydrologi ved at hæve bunden i ca. 1,4 km afvandingsgrøfter på projektarealet. Dette kan dog kun gøres hvis der tages hensyn til de omkringliggende arealer, der ikke er med i projektet. Det gøres ved at der, i det nordøstlige hjørne af matrikel 30a, etableres en 1.800 m² lavning startende i kote 11,20 m, med en dybde på ca. 0,2 m under terræn. Lavningen strækker sig ca. 80 m mod vest, hvorefter vandet vil løbe diffust på terrænet mod syd. I afvandingsgrøften i det nordøstlige hjørne af projektarealet, hvor vandet føres op i lavningen, og ligeledes der hvor vandet igen ledes ned i afvandingsgrøften (kortbilag 1) stensikres der med ralsten/bundsten svarende til i alt ca. 3 m³. Det ønskes også at udjævne en gammel ca. 15 cm dyb plovfure, der løber langs projektarealets nordlige grænse. Dette gøres for at skabe bedre sammenhæng med de omkringliggende arealer, og for at undgå at den unaturlige afledning af vand, som plovfuren kan skabe.

Fremtidig vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse består i at sikre at den hidtidige afvanding fra områderne opstrøms projektet forbliver den samme., således at områder udenfor projektarealet ikke påvirkes.

Tidsplan, økonomi og høring

Tiltagene forventes etableret efter 1. september 2025. Tiltagene vist herunder finansieres af Nationalparkfond Thy. Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger fra 11. august 2025 til 8. september 2025. Bemærkninger til projektet bedes sendes til teknisk@thisted.dk senest 8. september 2025.

Med venlig hilsen

Sigrid Vodstrup Lundbye
Vandløbssagsbehandler

Kortbilag 1 - projektoversigt

Kortet viser projektområdet, markeret med rød, og de forskellige tiltag der ønskes etableret. Hævning af vandløbsbunden er markeret med orange, afværgeforanstaltningen med lyseblå og udjævningen af plovfuren med lysegrøn.

